


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchů	
1		<b>TV Houbětín</b>	<b>67 dny</b>	<b>15.07. 19</b>	<b>15.10. 19</b>		
2		<b>Zálužská</b>	<b>67 dny</b>	<b>15.07. 19</b>	<b>15.10. 19</b>		
3		Demolice	5 dny	15.07. 19	19.07. 19		
4		Přeložka vodovodu	3 týdny	22.07. 19	09.08. 19	3	
5		Odkop HTÚ	5 dny	12.08. 19	16.08. 19	4	
6		UV	7 dny	19.08. 19	27.08. 19	5	
7		Konstrukční vrstvy	15 dny	28.08. 19	17.09. 19	6	
8		Pokládka obrubníků	3 dny	18.09. 19	20.09. 19	7	
9		Pokládka asfaltů	3 dny	23.09. 19	25.09. 19	8	
10		Pokládka dlažeb	4 dny	26.09. 19	01.10. 19	9	
11		Přeložka VO	14 dny	23.09. 19	10.10. 19	8	
12		Dokončovací práce	10 dny	02.10. 19	15.10. 19	10	
13		<b>Zelenečská 6E 0,05-0,150</b>	<b>67 dny</b>	<b>15.07. 19</b>	<b>15.10. 19</b>		
14		Odkop HTÚ	10 dny	15.07. 19	26.07. 19	355	
15		UV	10 dny	29.07. 19	09.08. 19	14	
16		Konstrukční vrstvy	15 dny	12.08. 19	30.08. 19	15	
17		Pokládka obrubníků	6 dny	02.09. 19	09.09. 19	16	
18		Pokládka asfaltů	3 dny	10.09. 19	12.09. 19	17	
19		Pokládka dlažeb	12 dny	13.09. 19	30.09. 19	18	
20		Přeložka VO	14 dny	10.09. 19	27.09. 19	17	
21		Dokončovací práce	11 dny	01.10. 19	15.10. 19	19	
22		<b>Zelenečská 5E 0,300-0,460</b>	<b>67 dny</b>	<b>15.07. 19</b>	<b>15.10. 19</b>		
23		Odkop HTÚ	10 dny	15.07. 19	26.07. 19	355	
24		UV	10 dny	29.07. 19	09.08. 19	23	
25		Konstrukční vrstvy	15 dny	12.08. 19	30.08. 19	24	
26		Pokládka obrubníků	6 dny	02.09. 19	09.09. 19	25	
27		Pokládka asfaltů	3 dny	10.09. 19	12.09. 19	26	
28		Pokládka dlažeb	12 dny	13.09. 19	30.09. 19	27	
29		Přeložka VO	14 dny	10.09. 19	27.09. 19	26	
30		Dokončovací práce	11 dny	01.10. 19	15.10. 19	28	

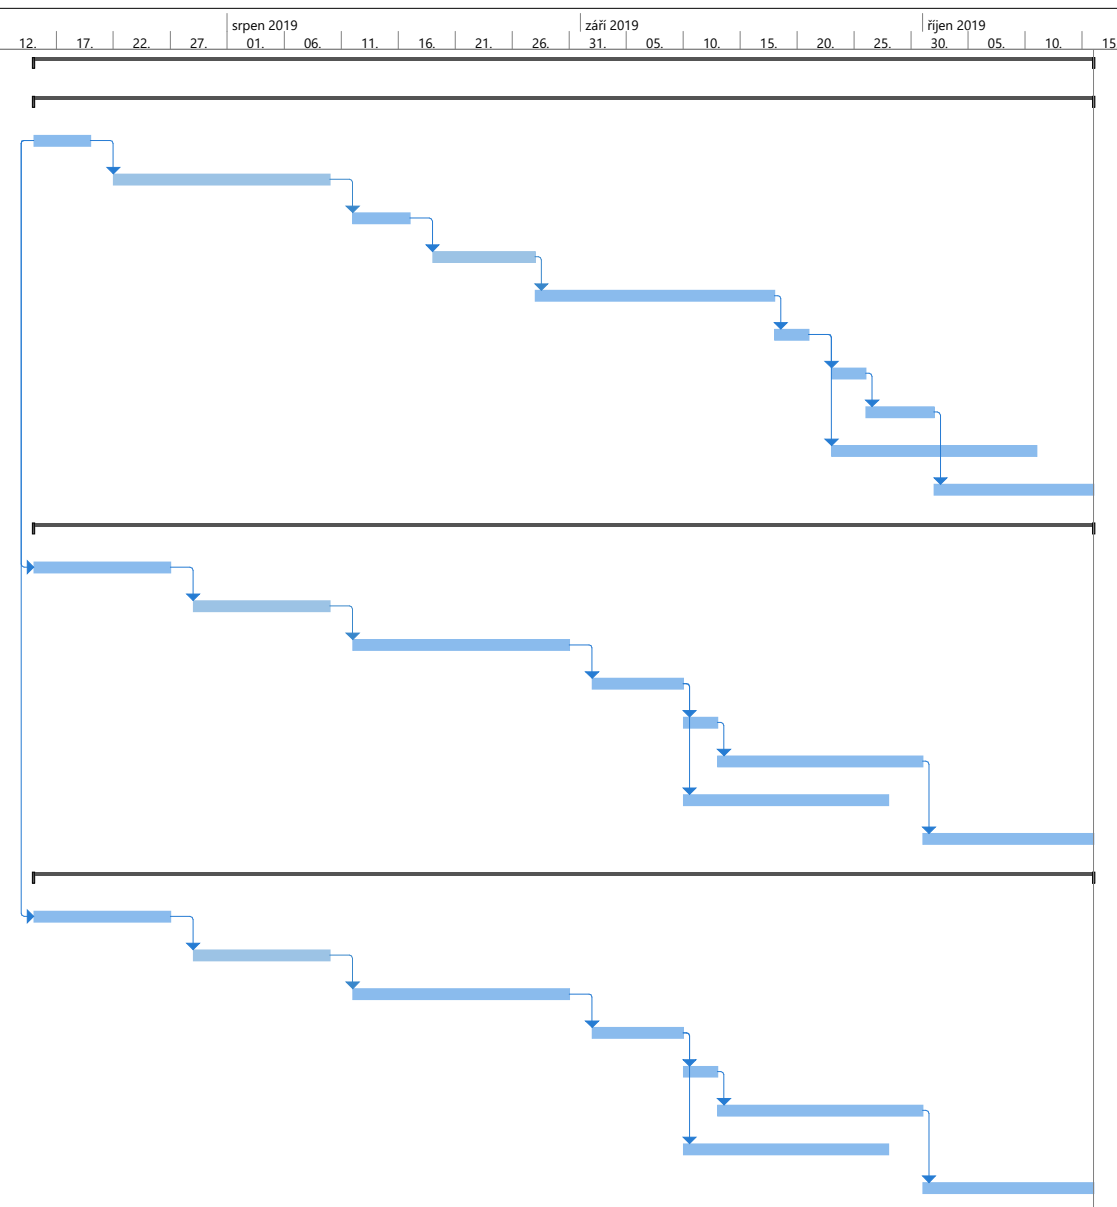

Projekt: HMG Hloubětín DIO1  
Datum: 28.06. 19

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termin	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			
